

Works Inspection Request - WIR

MIR Serial Number: طلب إستلام أعمال
Date: ٢٠٢٥/٠٥/٢٩ طلب تسليم
Location: جدة
Project Title: مشروع تلال الغروب
Consultant: مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Contractor: شركة طرق الرياض للمقاولات

Part A: By the Contractor:

Attachments (tick as appropriate)

Sketch attached to show the location(s) كروكي توضيحي للموقع
Approved Shop Drawing الرسومات التنفيذية المعتمدة
Inspection Check list قائمة الفحص
Test Reports (if any) تقارير اختبارات (إن وجدت)
Surveyor Field Sheet (if any) سجل إستلام الأعمال المساحية
Others (state) أخرى

Discipline: التصنيف
Civil إنشائي
Architectural معماري
Mechanical ميكانيكا
Electrical كهرباء
Other (state) أخرى

Description of Works to be inspected and / or tested:

كوراسفلت/طبقة ثانية

شارع رقم 03
بلوك 11

Works Quantity:

We certify that these works has been executed in accordance with the Contract Specifications and Approved Drawings
نشهد بأن الأعمال المذكورة أعلاه نفذت حسب مواصفات العقد وحسب المخططات المعتمدة

Name: الاسم: Signature: التوقيع: Designation: Designation: Designation: Designation: Date: التاريخ: 29/05/2025

Part B: By the Consultant:

Site Inspector's Comments:

ملاحظات القائم بالإستلام

Name: الاسم: Signature: التوقيع: Designation: Designation: Designation: Designation: Date: التاريخ: 29/05/2025

Witnessed Site Test Results (if any):

نتائج اختبارات الموقع (إن وجدت)
Passed مقبول
Failed مرفوض
N/A لا يوجد

Resident Engineer Final Comments & Decision:

ملاحظات مدير المشروع - إستشاري
Approved يعتمد
Approved with Comments يعتمد بملاحظات
Comply Comments and Resubmit معالجة الملاحظات وإعادة التقديم
Rejected مرفوض
Name: الاسم: Signature: التوقيع: Date: التاريخ: 29/05/2025


Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirement
اتخاذ هذه الموافقة لا تحفي المقاول من مسؤولياته تجاه مطابقة متطلبات العقد

Client	شركة طرق الرياض للمقاولات					Report No.	PRO-240463.118			
Project	مشروع البنية التحتية - مخطط نالان الغروب					Test Date	29-5-2025			
Location	جدة - حي الأمير فواز					Report Date	31-5-2025			
Location	Block 11					Tested By	Saddam			
Description:	BITUMINOUS WEARING COURSE LAYER									
ASPHALT CORES										
Sample No.	STATIONS	Thickness (cm)	Wt. In Air (g)	Wt. In Water (g)	Wt. in SSD (g)	VOLUME (cm³)	Gmb (g/cm³)	Gmm (g/cm³)	Compaction (%)	Required Compaction (%)
1	Street 01 STA. 50	5.1	840.2	492.35	845.6	353.25	2.378	2.576	92.3	
2	Street 01 STA. 160	5.3	855.5	501.2	861.2	360	2.376	2.576	92.3	
3	Street 02 STA. 60	5.4	866.4	510.7	870.3	359.6	2.409	2.585	93.2	
4	Street 02 STA. 170	5.5	875.3	515.6	885.2	369.6	2.368	2.585	91.6	
5	Street 03 STA. 45	5.4	861.2	504.2	868.7	364.5	2.363	2.591	91.2	
6	Street 03 STA. 180	5.5	874.6	512.2	880.5	368.3	2.375	2.591	91.7	
7	Street 04 STA. 65	5.1	835.2	492.2	840.6	348.4	2.397	2.582	92.8	
8	Street 04 STA. 200	5.3	854.2	504.9	850.3	355.4	2.403	2.582	93.1	






٢٠٢٥/٥/٢٩ م
الأمير عبدالمجيد
جدة
مكة المكرمة

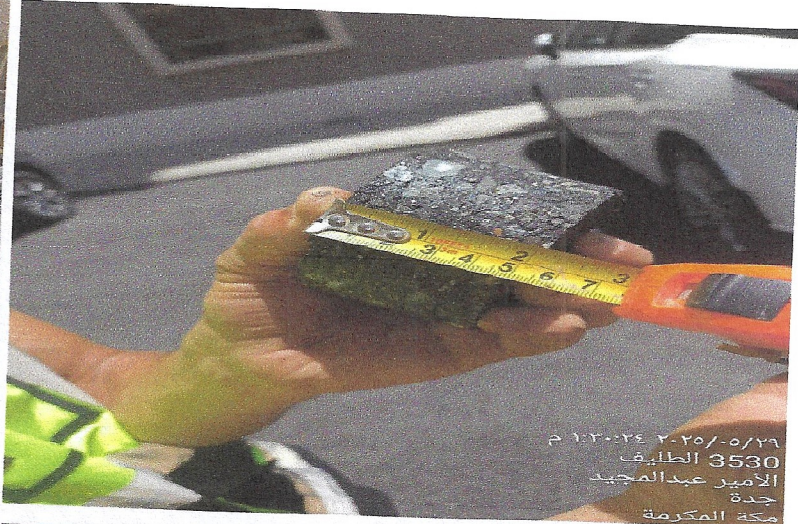

٢٠٢٥/٥/٢٩ م
الأمير عبدالمجيد
جدة
مكة المكرمة

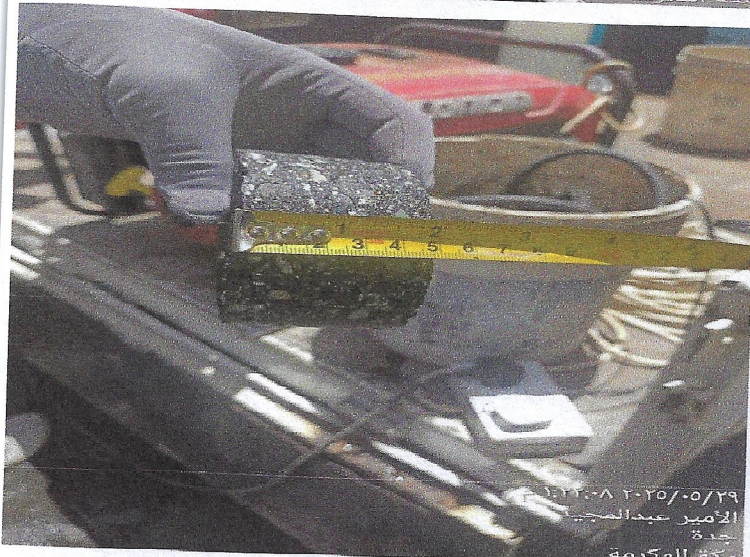

٢٠٢٥/٥/٢٩ م
الأمير عبدالمجيد
جدة
مكة المكرمة



٢٠٢٥/٥/٢٩ م
الأمير عبدالمجيد
جدة
مكة المكرمة



٢٠٢٥/٥/٢٩ م
الأمير عبدالمجيد
جدة
مكة المكرمة



٢٠٢٥/٥/٢٩ م
الأمير عبدالمجيد
جدة
مكة المكرمة



